

利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年

改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

中标候选人公示

利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年

改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

（招标编号：0773-2440GNOEGCGK6671）的评标工作已结束，现将推荐中标结果公示如下：

合同号：HP-G-24-002

投标人名称、开标价、评标价及废标原因：

1、投标人名称：衡阳宏盛建设有限公司

a) 开标价：人民币 2122872.36 元

b) 评标价：人民币 2122872.36 元

c) 废标原因：未按招标文件第 39 条规定时间内携带招标文件第 9 章规定的格式所开具的履约保函与业主签订合同

2、投标人名称：云南润超建筑工程有限公司

a) 开标价：人民币 3596858.3 元

b) 评标价：人民币 3596858.3 元

3、投标人名称：云南正润建设工程有限公司

a) 开标价：人民币 3314966.25 元

b) 评标价：人民币 3314966.25 元

4、投标人名称：云南煜升建设工程有限公司

a) 开标价：人民币 3391159.50 元

b)评标价：人民币 3391159.50 元

5、投标人名称：广西方信建设工程有限公司

a)开标价：人民币 3248874.53 元

b)评标价：人民币 3248874.53 元

c)废标原因：因在华坪县农业农村局 2024 年实施的在建项目施工中相继发生工期严重超期、不服从管理、拖欠民工工资、未按图纸施工，擅自改变施工地点等问题，不具备履行合同的能力

6、投标人名称：庆泽建设集团（云南）有限公司

a)开标价：人民币 2510062.63 元

b)评标价：人民币 2510062.63 元

c)废标原因：投标文件提供的业绩证明材料不满足招标文件资格审查一般经验的要求。

7、投标人名称：陕西光明建工集团有限公司

a)开标价：人民币 3265557.04 元（折扣后价格：3203184.90 元）

b)评标价：人民币 3265557.04 元（折扣后价格：3203184.90 元）

c) 废标原因：因在华坪县农业农村局 2024 年实施的在建项目施工中相继发生工期严重超期、不服从管理、拖欠民工工资、工程质量问题整改不到位、不及时等问题，不具备履行合同的能力

二、中标人名称、中标价、工期及合同范围

中标人名称：云南正润建设工程有限公司

中标价：人民币 3314966.25 元

工期：60 日历天

合同范围：新建机耕路及建设路边排水沟等基础配套设施。共 1 个合同段。

本项目中标候选人公示期为 **2025 年 04 月 14 日至 2025 年 04 月 17 日**。各投标人认为本次招标投标活动有不符合法律、法规和有关国际农业发展基金采购手册规定的，或对中标结果有异议的，请在公示期内，以书面形式函告知招标人或者中金招标有限责任公司，电子邮件：ifad_cctc@163.com

招 标 人：华坪县农业农村局

地 址：华坪县中心镇河东新城良安巷 8 号

联 系 人：杨桦

电 话：0888-6121718

邮 箱：hpxntjsglg718@163.com

招标代理机构：中金招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦 15 层

邮 编：100089

联 系 人：蔡娟/付美玲

电 话：13882275437/19150314637

电子邮件：ifad_cctc@163.com

关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）变更中标人的情况说明

丽江市农业农村局：

丽江市公共资源交易中心：

现有利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（合同号：HP-G-24-002，招标编号：0773-2440GNOEGCGK6671），于2025年01月17日上午9:00点（北京时间）在丽江市公共资源交易中心完成开评标工作，根据评标报告结果确定排名第一的衡阳宏盛建设有限公司为中标人，截止2025年2月14日下午17:00分，我方未收到中标人的合法代表与我方就投标项目的任何联系，于是我方在2024年2月17日向中标人发出《关于片区一、片区二签订合同的告知函》，详见附件1；到截止时间2025年2月22日，我方仍未收到中标人衡阳宏盛的任何回复，且未按要求提供授权书的指派代表及在规定时间内未提供履约保函参与本项目联络、合同谈判、合同签署事宜。于是我方按照招标文件要求向中标人衡阳宏盛发出《未按要求签订合同的函》，详见附件2；

由于排名第一的中标人（衡阳宏盛建设有限公司）未按招标文件第39条规定时间内携带招标文件第9章规定的格式所开具的履约保函到华坪县农业农村局签署合同，根据招标文件第39.2条履约保证金的相关规定“如果中标人未能根据上述要求提交履约保证金或签署合同协议书，业主将取消合同，并没收其投标保证金。在此情况下，业主将把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。”

投标报价排名第二的陕西光明建工集团有限公司，投标价为3203184.90元；投标报价排名第三的广西方信建设工程有限公司，投标价为3248874.53元，以上两家公司于

2024年04月分别以异常低价的情况中标了我局“利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(石龙坝镇德茂村灌溉沟渠工程)项目”和“利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(船房乡灌溉沟渠工程)项目”，两个公司在工程实施工程中，均相继发生了施工工期严重超期、施工单位不服从管理、拖欠农民工工资和工程质量整改不及时引发群众上访等严重问题，证明材料详见附件3和附件4；该情况经报云南省农业农村厅农发项目管理办公室及国际农发基金已同意。汇报材料详见附件5；故我局认为陕西光明建工集团有限公司和广西方信建设工程有限公司不具有履行合同的能力，该情况经报云南省农业农村厅农发项目管理办公室及国际农发基金已同意。证明材料详见附件6；

根据评标报告及评审附表，下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人为云南正润建设工程有限公司，投标报价为3314966.25元，故根据招标文件要求，我方依规选择依次递交了最低评标价且实质性响应招标文件的中标候选人，云南正润建设工程有限公司作为本项目的中标人。

特此说明！

- 附件1：《关于第一名衡阳宏盛签订合同的告知函》及邮件发送证明；
- 附件2：《关于第一名衡阳宏盛未按要求签订合同的告知函》及邮件发送证明；
- 附件3：陕西光明不具备履行合同能力的证明材料；
- 附件4：广西方信不具备履行合同能力的证明材料；
- 附件5：向省办汇报材料；
- 附件6：农发回复意见证明材料；



附件 1：关于第一名签订合同的告知函及邮件发送证明
给第一名中标人衡阳宏盛建设有限公司发出的告知函及邮件发送证明；

关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区一）、利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

签订合同的告知函

衡阳宏盛建设有限公司：

现有利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区一）、利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二），于2025年01月17日上午9:00点（北京时间）在丽江市公共资源交易中心完成开评标工作，根据评标报告结果确定排名第一的**衡阳宏盛建设有限公司**为中标人，于2025年1月24日完成中标结果公示。

1、根据中标通知书的约定，中标人需在收到中标通知书后28天内，即2025年2月22日前中标人应根据合同条款以及“投标人须知”第32.5款的规定，采用本招标文件第九章规定的履约保函形式或业主可接受的其他形式向业主提交履约保证金，并到华坪县农业农村局（指定地点）签署合同；根据招标文件第39.2条履约保证金的相关规定，“如果中标人未能根据上述要求提交履约保证金或签署合同协议书，业主将取消合同，并没收其投标保证金。在此情况下，业主将把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。”


2、根据招标文件及投标文件投标函承诺，你方应指派代表参与本项目的联络、谈判及合同签署等与本项目相关的授权事宜并安排项目经理到现场履职。你方所派出的代表，除法人外，均需提供法人授权书（内附公司社保缴纳证明）参与项目谈判、签署合同事宜，未按要求提供授权书的不得参与本项目联络并视为你方未出席联络；

3、截止2025年2月14日下午17:00分，你方合法的代表并未与我方取得任何联系，谨以此函告知你方，请按招标文件要求在规定的时间内派出合法的代表与我方联络并在规定的时间内提交履约保函，如果你方未按要求提交履约保函并签署合同协议书，我方将按照招标文件规定取消你方合同，并没收投标保证金。在此情况下，业主将把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。

特此告知！

中金招标有限责任公司

华坪县农业农村局
2025年02月14日



附件 2：关于第一名未按要求签订合同的告知函及邮件发送证明；

给第一名中标人衡阳宏盛建设有限公司发出的未按要求签订合同的告知函及邮件发送证明；

关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区一）
未按要求签订合同告知函

衡阳宏盛建设有限公司：

现有利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区一）（合同号：HP-G-24-001，招标编号：0773-2440GNOEGCGK6670），于2025年01月17日上午9:00点（北京时间）在丽江市公共资源交易中心完成开评标工作，根据评标报告结果确定排名第一的衡阳宏盛建设有限公司为中标人，于2025年1月24日签发中标通知书，根据招标文件第39条履约保证金的约定，根据中标通知书和招标文件要求，中标人需在收到中标通知书后28天内，即2025年2月22日前中标人应根据合同条款以及“投标人须知”第32.5款的规定，采用本招标文件第九章规定的履约保函形式或业主可接受的其他形式向业主提交履约保证金，并到华坪县农业农村局（指定地点）签署合同；我方于2025年2月17日向你方发出《关于签订合同的告知函》，告知时间及相关事宜。详见附件；

- 1、到截止时间，我方未收到你方任何回复，且你方未按要求提供授权书的指派代表参与本项目的联络、合同谈判、合同签署等相关事宜；
- 2、到截止时间，我方未收到你方开具的履约保函，根据招标文件第39.2条履约保证金的相关规定“如果中标人未能根据上述要求提交履约保证金或签署合同协议书，业主将取消合同，并没收其投标保证金。在此情况下，业主将把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。”

特此告知！



关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）
未按要求签订合同告知函

衡阳宏盛建设有限公司：


现有利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（合同号：HP-G-24-002，招标编号：0773-2440GNOEGCGK6671），于2025年01月17日上午9:00点（北京时间）在丽江市公共资源交易中心完成开评标工作，根据评标报告结果确定排名第一的衡阳宏盛建设有限公司为中标人，于2025年1月24日签发中标通知书，根据招标文件第39条履约保证金的约定，根据中标通知书和招标文件要求，中标人需在收到中标通知书后28天内，即2025年2月22日前中标人应根据合同条款以及“投标人须知”第32.5款的规定，采用本招标文件第九章规定的履约保函形式或业主可接受的其他形式向业主提交履约保证金，并到华坪县农业农村局（指定地点）签署合同；我方于2025年2月17日向你方发出《关于签订合同的告知函》，告知时间及相关事宜。详见附件；

- 1、到截止时间，我方未收到你方任何回复，且你方未按要求提供授权书的指派代表参与本项目的联络、合同谈判、合同签署等相关事宜；
- 2、到截止时间，我方未收到你方开具的履约保函，根据招标文件第39.2条履约保证金的相关规定“如果中标人未能根据上述要求提交履约保证金或签署合同协议书，业主将取消合同，并没收其投标保证金。在此情况下，业主将把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。”

特此告知！



附件 3：陕西光明 建工集团有限公司不具备履行合同能力的证明材料
陕西光明建工集团有限公司 24 年中标项目《施工合同》

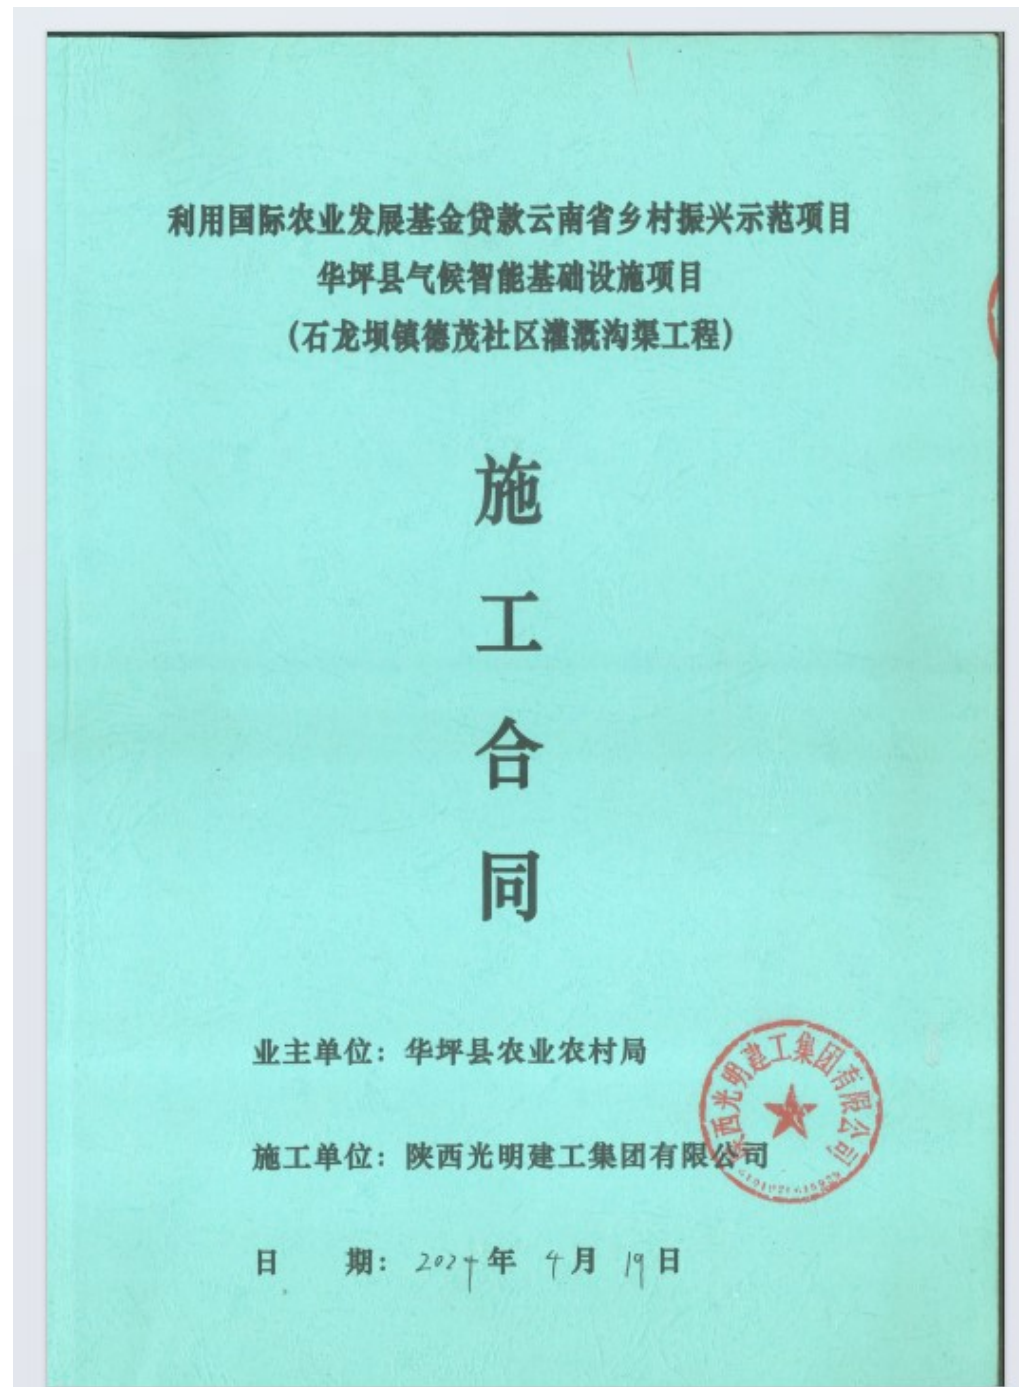

项目实施过程中，监理签发的整改通知单

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程) 编号: 01

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于保证施工质量、加强安全教育防范的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

- 你单位施工现场应加强安全教育。
- 施工过程中你单位应保证施工质量,严格按照设计规范要求施工。

针对上述存在的问题,要求你单位于 2024 年 5 月 27 日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字): 张伯仁

2024年 5月 22日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程) 编号: 02

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于未按图纸施工的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

1、你单位正在施工1号沟未按图纸施工,要求你单位严格按图纸施工。

针对上述存在的问题,要求你单位于2024年6月2日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

2024年5月28日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)

编号: 03

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于上报前期开工资料的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

- 1、你单位于 2024 年 5 月 20 日进场开工,截至 2024 年 6 月 3 日前期开工资料未全部上报完成,进度与资料不同步。
- 2、要求你单位在今后施工中严格控制施工质量,同时保证资料进度与施工进度同步。

针对上述存在的问题,要求你单位于 2024 年 6 月 8 日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)
总/专业监理工程师(签字)
项目监理部
2024 年 6 月 3 日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程) 编号: 04

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于雨季施工安全的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

- 1、你单位现施工期间为雨季,要求你单位在保证施工进度的同时,加强安全教育,保证施工安全。
- 2、你单位施工区处于农田基本道路边,要求你单位增加安全警示标志提醒过往人员注意安全。

针对上述存在的问题,要求你单位于 2024 年 7 月 20 日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字) 侯志斌

2024 年 7 月 15 日

注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(玉龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)

编号: 05

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于施工进度滞后、保证施工质量、工期的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(玉龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

- 1、你单位开工日期为 2024 年 5 月 20 日,合同工期为 90 日历天,完工日期应为 2024 年 8 月 20 日,中间停工的工期扣除以外,竣工日期为 2024 年 9 月 30 日完工
- 2、经检查玉龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程施工现场施工人员较少,施工进度滞后,经多次催促、督促你单位加快施工进度,但是施工进度仍未改变。
- 3、现要求你单位加快施工进度,增加施工班组,在 2024 年 10 月 30 日完成全部施工内容。按合同约定,超出合同工期每天按 2000 元罚款,从超期之日起至工程全部完工之日止,造成的一切损失及责任由你单位全权承担。
- 4、你单位施工过程中应保证施工质量,严格按照规范及设计要求施工。
- 5、你公司必须严格按以上要求及规范进行施工,若不按要求施工造成损失由你公司自行承担,并按合同约定进行处罚。

针对上述存在的问题,要求你单位于 2024 年 8 月 25 日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

项目监理部

2024 年 8 月 20 日

注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(玉龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)

编号: 06

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于渠道通水后沉降缝漏水的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(玉龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

1、你单位施工完成沟渠后通水,发现渠道靠机耕路侧及沉降缝位置出现渗漏情况,严重影响农田灌溉及排水效果;通过参建各方现场踏勘后,会议确定,要求你单位对在沟底板上加一层(5cm 厚)混凝土,对靠机耕路边边墙如有较大孔洞进行清填。

针对上述存在的问题,要求你单位于 2025 年 1 月 10 日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)
总/专业监理工程师(签字) 2025 年 1 月 6 日

注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)

编号: 07

致:陕西光明建工集团有限公司

事由: 关于渠道通水后沉降缝漏水防渗处理完成的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目(石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程)经现场检查,对相关问题的通知如下:

1、你单位施工完成后,发现渠道靠机耕路侧及沉降缝位置出现渗漏情况,于监理通知(2025年1月6日 06号)明确过施工处理方式,截至2025年2月17日,你单位进度缓慢未全部处理完成,要求你单位增加施工人员于2月底全部处理完成。

针对上述存在的问题,要求你单位于2025年2月22日前整改落实并回复监理部。

项目监理机构(盖章)
总/专业监理工程师(签字)
项目监理部
2025年2月17日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

德茂片区沟渠渗水整改会议记录

会议时间：2025年1月6日

会议地点：德茂社区村委会

由于该片区沟渠渗水问题严重影响了农户用水和农田排水的效果，为了解决这一问题，四方代表实地踏勘，开展一次渗水整改工作，要求施工单位尽快进行修复。

参会单位：

华坪县农业农村局

华坪县德茂社区

陕西光明建工集团

利水工程咨询有限公司

后附签到表

会议纪要：

1. 背景介绍：

沟渠渗水问题严重，影响农田灌溉和排水效果。

渗水需立即得到修复，确保灌溉和排水正常进行。

2. 初步解决方案

在原沟底板上加一层(5cm厚)混凝土。

原沟底砂石清理干净。

沉降缝处理。

靠机耕路边边墙如有较大孔洞必须清填。

3. 工作计划

1月7日开始进场施工，计划主沟渠在1月10日前完成。

施工方需积极组织施工队伍，并及时修复沟渠。

修复工程完成后，由专业验收人员进行验收，确保渗水问题得到彻底解决。

总结：

本次会议确定了该片区灌溉沟渠渗水整改计划，着重解决农田灌溉和排水影响的问题。会议强调施工方必须重视质量与安全，以保证修复工作的质量和进度，监测和验收工作。

利水工程咨询有限公司

陕西光明建工集团有限公司承接石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠改造工程拖欠民工工资欠条

欠 条

本人 施 欠 荣、敏、蒋

(工程地名: 华坪县石龙坝)

工程名称: 利用国债资金建设石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠项目
农民工工资 38000.00 元 (大写: 叁万捌仟元整)。本

人承诺该工资于 2024 年 10 月 10 日前付清, 若本人在该期限内没有付清该欠款, 以上九位农民工可向工程所在地人民法院提起诉讼, 所产生的诉讼费、保全费、律师费等费用均由本人承担。

此据

欠款人

身份证号码: 53503

联系电话: 1308828

2024 年 9 月 13 日

陕西光明建工集团有限公司承接石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠改造工程因拖欠民工工资引起的市长热线（因涉密信息，仅提供部分内容）

丽江市政务信息平台工单

事件发生地	丽江市华坪县石龙坝镇
反映内容	2024 年 10 月 5-11 月 6 日我们在华坪县石龙坝镇德茂村给当地农业农村局下面的承包老板做田边的水沟，老板欠我们 万多元，现该老板不接我们电话，请相关部门帮忙协调处理。

陕西光明建工集团有限公司承接石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠改造工程造成的质量缺陷现场照片图





陕西光明建工集团有限公司承接石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠改造工程造成的群众信访(因涉及民工信息，仅提供部分信息以供证明)

华坪县农业农村局人民群众信件详情表

华坪县农业农村局人民群众信件详情表

信访人信息	姓名		证件类型	居民身份证	证件号码	533216	
	出生日期		性别		民族		
	手机号码	15919	是否特殊人员		职业		
	户口所在地	云南省丽江市华坪县石龙坝镇					
	实际居住地	德茂社区一组			政治面貌		
信访诉求信息	信件号	LF530722025021800014	信访形式	群众来访	办理状态		
	标题						
	致件				信访日期	2025 年 02 月 18 日	
	登记机构类别	区县信访局	首次信访日期	2025 年 02 月 18 日	首次信访机构	华坪县信访局	
	信访目的类别	申诉求决_求决	信访人数	1	涉及人数	1	
	一级类别分类	农村农业	二级类别分类	水利水电	三级类别分类	引水调水	
	是否群体意愿	否	信访人公开意愿	否	三跨三分离标志	否	
	积案标志	否	重大紧急标志	否	匿名标志	否	
	是否扬言	否	热点问题		信访原因		
	被反映人级别					被反映人职务	
	被反映人住址					被反映人或单位	
	问题属地		石龙坝镇			要求办结	2025 年 04 月 19 日

			日期		
	诉求内容		反映：2024 年 5 月修建德茂社区一组、七组、八组、九组农用灌溉沟，其户农田段沟底漏水，向社区反映，答复六月份火把节后处理，直到十二月份才进行处理，处理后沟底仍然漏水，影响其户种植玉米及小春作物，请求解决。		
送 达 登 记 信 息	办理机构		办理时间		
	送达方式		送达人		送达时间
	签收状况		信访人意见		
	意见书内容				

办 理 结 果	办理类型	办理时间	办理结果
------------------	------	------	------

办 理 流 转 信 息	流转类型	处理部门	处理人	处理时间	处理意见
	转送-需逐级确认处理意见书	华坪县信访局		2025 年 02 月 18 日	经初步了解，不只是信访人农田段沟底漏水，其他段沟底存在不同程度的漏水。请县农业农村局高度重视，对信访人反映的问题进行分析研判，切实解决该问题。
	登记	华坪县信访局		2025 年 02 月 18 日	

诸如此类问题的相关证明材料因涉密及涉及民工信息，不宜完全公开，仅以此证明陕西光明建工集团有限公司在承接利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目石龙坝镇德茂社区灌溉沟渠工程中出现的**施工工期严重超期、施工单位不服从管理、拖欠农民工工资和工程质量整改不及时**引发群众上访等严重问题。同时，据了解，陕西光明建工在其他项目上出现同样的问题，被投诉和抱怨。

附件 4:

广西方信建设工程有限公司不具备履行合同能力的相关佐证材料

一、广西方信建设工程有限公司 24 年中标项目《施工合同》

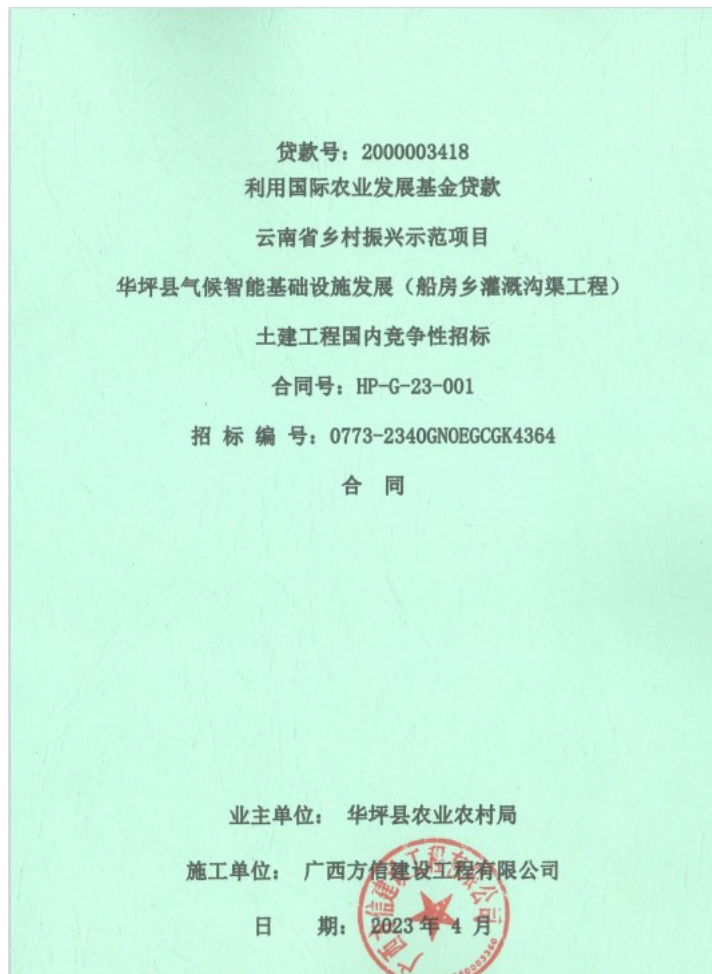


图 1

二、项目实施过程中，监理签发的整改通知单

监理单位通知单

工程名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目

致: 广西方信建设工程有限公司

通知内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌溉沟渠工程项目已开工, 为做好工程安全、防火、质量工作, 现通知如下:

1、每条沟渠都要严格按照设计图纸和施工工序进行规范施工, 每条沟渠清理完成后必须先进行报验, 经监理验收合格后方可进行下一步施工。

2、未进行报验的监理单位一律不认可该工程量, 未得到批准私自施工造成的损失由你单位自行负责。

3、你公司必须严格按照以上要求及规范进行施工, 若不按要求施工造成的损失由你公司自行承担, 并按合同约定进行处罚。

4、加强安全教育、提高安全生产意识; 施工现场必须设置安全标语、警示牌; 临边、临坡应做好安全警示标语及安全护栏。

5、现已进入防火期, 施工单位做好防火安全交底, 配备好防火灭火设施。

6、施工单位做好防火安全工作, 从根本上杜绝火灾隐患, 如不按要求进行防火安全工作, 所造成的损失由你单位自行负责。

附: 此监理工程师通知单抄送至建设单位(华坪县农业农村局)

项目监理单位: 广西方信建设工程有限公司

总/专业监理工程师: 侯志远

日期: 2024年4月18日

监理单位通知单

工程名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目

编号: 01

致: 广西方信建设工程有限公司

事由: 关于未按图纸要求及相关规范施工、加强安全教育防范的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌溉沟渠工程项目经现场检查, 对相关问题的通知如下:

1、经检查你单位承建的船房乡灌溉沟渠部分渠系未按图纸要求设置伸缩缝。

2、你单位在浇筑混凝土时应严格按照设计图纸要求浇筑 C20 砼, 配料时严格按照混凝土配合比进行搅拌, 不得添加土石块料, 若发现不按设计要求和规范进行施工的, 需返工整改。

3、为保证渠道水平及高程控制, 各个施工段测量技术人员应配备水平仪实时检测水平及高程是否符合设计要求。

4、你单位应加强安全教育、提高安全生产意识; 施工现场必须佩戴安全帽设置安全标语、警示牌; 临边、临坡应做好安全警示标语及安全护栏。

5、你公司必须严格按照以上要求及规范进行施工, 若不按要求施工造成的损失由你公司自行承担, 并按合同约定进行罚款处罚。

针对上述存在的问题, 要求你单位于 2024 年 5 月 27 日前整改落实并回复监理单位。

项目监理单位(盖章)

总/专业监理工程师(签字): 侯志远

2024年5月20日

监理单位通知单

工程名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目

编号: 02

致: 广西方信建设工程有限公司

事由: 关于未按图纸要求及相关规范施工、加强安全教育防范的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌溉沟渠工程项目经现场检查, 对相关问题的通知如下:

1、经检查你单位承建的船房乡灌溉沟渠工程, 现场施工人员较少, 进度缓慢, 应增加施工人员和班组。

2、你单位应加强安全教育、提高安全生产意识; 施工现场必须设置安全标语、警示牌; 临边、临坡应做好安全警示标语及安全护栏。

3、你公司必须严格按照以上要求及规范进行施工, 若不按要求施工造成的损失由你公司自行承担, 并按合同约定进行处罚。

针对上述存在的问题, 要求你单位于 2024 年 6 月 27 日前整改落实并回复监理单位。

项目监理单位(盖章)

总/专业监理工程师(签字): 侯志远

2024年6月25日

监理单位通知单

工程名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目

编号: 03

致: 广西方信建设工程有限公司

事由: 关于施工进度滞后、保证施工质量、加强安全教育防范的通知。

内容: 你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌溉沟渠工程项目经现场检查, 对相关问题的通知如下:

1、经检查船房乡灌溉工程, 施工人员较少施工进度滞后, 你单位开工日期为 4 月 15 日, 完工日期应为 7 月 15 日, 合同工期为 90 日历天, 要求施工方增加施工人员, 加快施工进度, 如果未在合同工期内完工将按照合同约定进行罚款处罚。

2、你单位应加强安全教育、提高安全生产意识; 施工现场必须设置安全标语、警示牌; 临边、临坡应做好安全警示标语及安全护栏。

3、你单位应保证施工质量, 严格按照规范要求施工。

4、你公司必须严格按照以上要求及规范进行施工, 若不按要求施工造成的损失由你公司自行承担, 并按合同约定进行处罚。

针对上述存在的问题, 要求你单位于 2024 年 7 月 6 日前整改落实并回复监理单位。

项目监理单位(盖章)

总/专业监理工程师(签字): 侯志远

2024年7月19日

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

监理工程师通知单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目
编号: 04

致广西方信建设工程有限公司

事由:关于合同到期建设内容未完成、保证施工质量、加强安全教育防范的通知。

内容:你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目—船房乡灌漭沟渠工程自开工以来,对相关问题通知如下:

1、你单位开工日期为2024年4月15日,合同工期为90日历天,至2024年7月16日。合同工期到期,你单位工程建设内容还未完成,要求你单位增加施工人数,加快施工进度,重新制定施工进度计划,超出合同工期按合同以每天2000元进行处罚。

2、你单位应加强安全教育、提高安全生产意识,施工现场必须设置安全标语、警示牌、临边、临坡应做好安全警示标语及安全护栏。

3、你单位应保证施工质量,严格按照规范要求施工。

4、你单位必须严格按照以上要求及规范进行施工,若不按要求施工造成损失由你单位自行承担,并按合同约定进行处罚。

针对上述存在的问题,要求你单位于2024年7月20日前整改落实并回复监理单位。

附:此监理工程师通知单抄送建设单位(华坪县农业农村局)

项目监理单位(盖章)
总/专业监理工程师(签字) 2024年7月18日

注:本表一式三份,项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

整改通知

(监理 [2024] 第 001 号)

合同名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌漭沟渠工程

致(承包人现场机构): 广西方信建设工程有限公司

由于本通知所述原因,通知你方对 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌漭沟渠工程自开工以来,对相关问题通知如下:

整改原因:
工程部位施工质量存在问题,经检查船房乡灌漭沟渠工程四组1号内渠支护侧壁未达到设计厚度,视为不合格工程。

整改要求:
1、要求施工单位三日内将不合格部位的渠壁拆除重建,重建后经监理单位、建设单位检查合格后,才能进行下一步施工。

2、你单位必须严格按照以上要求及规范进行施工,若不按要求施工造成损失由你单位自行承担,并按合同约定进行处罚。

3、加强安全教育、提高安全生产意识,施工现场必须设置安全标语、警示牌;临边、临坡应做好安全警示标语及安全护栏。

监理单位: (名称及盖章) 水利工程有限公司
总监理工程师: (签名) 侯志忠
日期: 2024年7月17日

承包人: (现场机构名称及盖章) 广西方信建设工程有限公司
签收人: (签名)
日期: 年 月 日

说明: 本表一式 份,由监理单位填写,承包人签收后,发包人 份、监理单位 份、承包人 份。

整改通知

(监理 [年] 第 号)

合同名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌漭沟渠工程

致(承包人现场机构):

由于本通知所述原因,通知你方对 船房乡灌漭沟渠工程四组1号内渠支护侧壁未达到设计厚度,视为不合格工程。工程自开工以来,对相关问题通知如下:

整改原因: 左砌墙未达到设计厚度,原有老沟渠侧壁未清理干净,未进行凿毛

整改要求: 将原有老沟渠侧壁进行清理,清理干净后进行凿毛,将模板拆除重新进行支护,必须按设计尺寸进行支护

监理单位: (名称及盖章)
总监理工程师: (签名)
日期: 年 月 日

承包人: (现场机构名称及盖章)
签收人: (签名)
日期: 年 月 日

说明: 本表一式 份,由监理单位填写,承包人签收后,发包人 份、监理单位 份、承包人 份。

工程联系单

工程名称: 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌漭沟渠工程

编号: 06

致: 广西方信建设工程有限公司

事由: 关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌漭沟渠工程(二期)严重超期的通知及整改要求。

内容: 由你公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目——船房乡灌漭沟渠工程(二期)严重超期及春节后复工资料的通知如下:

1、根据合同约定,该工程开工日期为2024年4月15日,合同工期为90日历天,完工日期应为2024年7月16日,但截至目前,工程实际进度与计划进度严重不符,已超过合同约定的完工日期,超期217天,超过合同工期按合同以每天2000元进行处罚。

2、请在2025年2月20日前提交详细的赶工计划,明确各阶段工期目标及具体措施。

3、增加施工人数、设备投入,优化施工工序,保证施工质量。

针对上述存在的问题,要求你单位于2025年2月20日前整改落实并回复监理单位。

项目经理机构: 水利工程有限公司
总/专业监理工程师: (签字) 侯志忠
日期: 2025年2月18日

注: 本表一式三份,项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



图 2 （共十份）

广西方信建设工程有限公司自 2024 年在华坪县船房乡沟渠工程实施之日起至今未报送单元工程质量评定材料，对监理单位发出的监理通知书不做回复、不按要求整改，且项目经理戴记新不按要求履职，要求立即整改的不合格工程至今未整改。


三、此图沟渠为广西方信建设工程有限公司于 2024 年在船房村实施的灌溉沟渠，因未按设计要求施工，要求立即整改落实，至今未整改，导致现在村民春耕灌溉用水困难。



图 3

四、广西方信建设工程有限公司承接船房乡灌溉灌渠工程拖欠民工工资欠条（因涉及民工信息，仅提供样式以供证明、部分信访材料因广西方信建设工程有限公司拖欠当事人工资，涉及利益纠葛未全部展示）

图 4

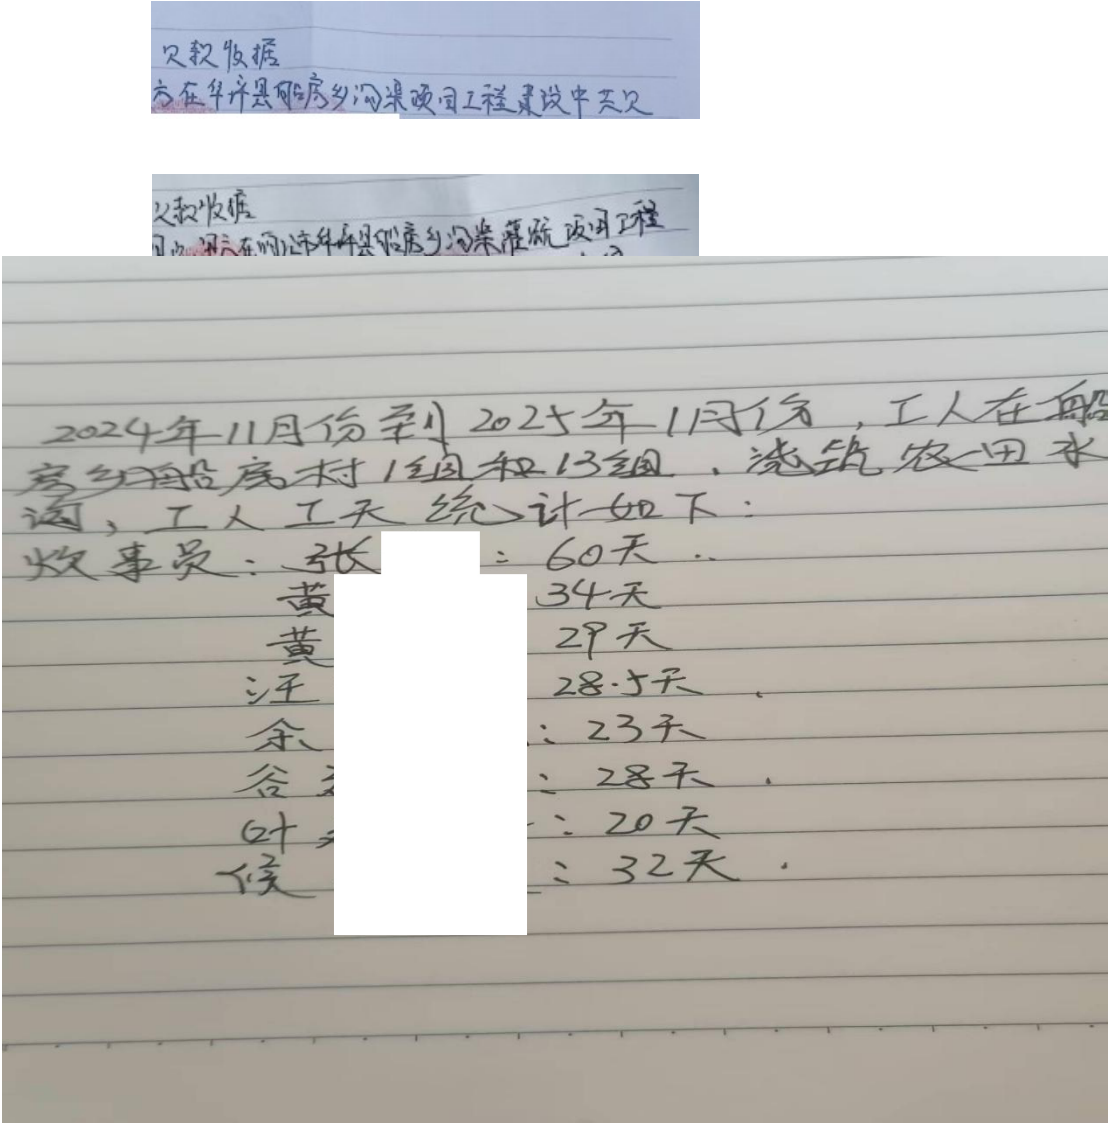

船房村15组农用水沟三面光建设工人花名册。

张 [redacted] 13769 [redacted] 98

丁 [redacted]

贺 [redacted] 1510885 [redacted]

谭 [redacted] :

雷 [redacted] : 159 [redacted] 41596

卢 [redacted] : 136 [redacted] 8596

胡 [redacted]

贺 [redacted] : 1528764 [redacted] 0

张 [redacted] : 139 [redacted] 67

雷 [redacted] :

刘 [redacted] :

李 [redacted] : 1591278 [redacted]

卢 [redacted]

吴 [redacted]

贺 [redacted]

王 [redacted]

何 [redacted]

王 [redacted]

过年前农民工到华坪县农业局信访追要工资，至今未付。

（因涉及当事人利益纠葛未全部展示）

五、广西方信建设工程有限公司承接船房乡灌溉灌渠工程未按设计图纸施工证明材料；经核实，以下内容未经报告及审批同意，施工单位擅自调整建设沟渠位置：

关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目--船房乡灌溉沟渠工程项目未按设计图纸施工私自更改位置沟渠统计

船房乡一组：

- (1) 新增 1 号沟渠：156.7 米 (0.3*0.4m)
- (2) 新增 2 号沟渠：47.7 米 (0.3*0.4m)

船房乡三组：

- (1) 新增 1 号沟渠：79.3 米 (0.3*0.4m)
- (2) 新增 2 号沟渠：203 米 (0.3*0.4m)
- (3) 新增 3 号沟渠：36 米 (0.3*0.4m)
- (4) 新增 4 号沟渠：15 米 (0.3*0.4m)

船房乡四组：

- (1) 新增 1 号沟渠：30 米 (0.3*0.4m)

船房乡 13 组：

- (1) 新增 1 号沟渠：26.2 米 (0.3*0.3m)
- (2) 新增 2 号沟渠：92 米 (0.3*0.3m)
- (3) 新增 3 号沟渠：61.7 米 (0.3*0.3m)
- (4) 新增 4 号沟渠：52 米 (0.3*0.3m)
- (5) 新增 5 号沟渠：113.4 米 (0.3*0.3m)

报送单位：利水工程咨询有限公司



图 5

工作联系单

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目--船房乡灌溉沟渠工程项目

编号: 001

致:华坪县农业农村局

事由: 关于广西方信建设工程有限公司承建的利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目--船房乡灌溉沟渠工程项目工程开工至今为止工程中存在的问题如下:

1、船房乡船房村灌溉沟渠工程部分沟渠, 未告知甲方及监理单位, 也未做书面变更申请, 私自更改位置进行浇筑。

2、施工完成后, 部分建筑余料及垃圾, 堆积在公路边, 未进行清理, 有严重安全隐患; 已下发通知但仍未处理。

3、工程进度缓慢, 工期严重超期, 多次向施工单位下达书面通知, 要求增加施工人员, 施工方置之不理, 不回复也不增加施工人员, 至今为止也未能组织有效施工。

4、部分沟渠爆模导致尺寸小于设计尺寸, 向施工单位下发整改通知, 施工单位不回复也不进行整改。

5、部分沟渠, 只浇筑中间部分, 首尾没有浇筑贯通。

6、部分沟渠基础提前开挖, 没有及时进行浇筑, 至今仍然搁置未浇筑。

7、该工程按照合同约定时间于 2024 年 7 月 16 日到期, 超期 246 日, 属于严重超期, 期间下发多次监理通知单, 督促施工方增加施工人员, 施工单位不做回复, 也不组织有效施工措施。

8、部分沟渠, 不按照规范要求进行报验, 就开始浇筑; 我方下发监理工程师通知单, 施工方不回复, 也不按规范要求进行报验。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

衡志山

2025年3月13日

图 6

诸如此类问题的相关证明材料因涉密及涉及民工信息，不宜完全公开，仅以此证明广西方信建设工程有限公司在承接利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施项目船房乡灌溉沟渠工程中出现的施工工期严重超期、施工单位不服从管理、拖欠农民工工资和工程质量整改不及时引发群众上访、未按图纸施工，擅自改变施工地点等严重问题。同时，据了解，广西方信在其他项目上出现同样的问题，被投诉和抱怨。

附件 5：向省办汇报材料及省办回复证明；

华坪县农业农村局依规向省办汇报片区一合理顺延中标人的材料证明；

华坪县利用国际农业发展基金实施 乡村振兴项目工作领导小组办公室文件

华农发基金办报〔2025〕2号

签发人：李国鑫

关于请求同意利用国际农业发展基金贷款云 南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年改善 气候应对能力的基础设施(改造提升片区 一)项目合理顺延中标人的报告

云南省农业农村厅农发项目管理办公室：

华坪县农发基金项目办开展了利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施(改造提升片区一)(合同号：HP-G-24-001、招标编号：0773-2440GNDEGCGK6670)的招标工作，于 2025 年 01 月 17 日上午 9:00 点在丽江市公共资源交易中心完成开评标工作，共收到 4 家投标人递交投标文件。

一、招标情况

评审专家对通过初步评审的单位，按照评标价由低到高的顺序，进行资格审查。投标保证金排名第一的投标单位为**衡阳宏盛建设有限公司**，投标价为 2380480.07 元，工期 60 日历天，

— 1 —

该投标人满足招标文件规定的资格条件，通过资格评审。**衡阳宏盛建设有限公司**未按规定在规定时间内与华坪县农业农村局签订施工合同，且未对《告知函》(详见附件 1)进行回复，因此，按程序将取消**衡阳宏盛建设有限公司**的中标资格并把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。

投标保证金排名第二的陕西光明建工集团有限公司，投标价为 3168957.68 元；投标保证金排名第三的广西方信建设工程有限公司，投标价为 3250561.14 元；投标保证金排名第四的云南顺兴水利水电工程有限公司，投标价为 3268651.98 元；根据评标报告内容显示，以上三家投标单位均已实质性响应招标文件。

二、拟拒绝接受中标单位及理由

2024 年 04 月，陕西光明建工集团有限公司和广西方信建设工程有限公司分别以异常低价的情况中标了“利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(石龙坝镇德茂村灌溉沟渠工程)项目”和“利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(船房乡灌溉沟渠工程)项目”，要求两家公司分别提高履约担保至 20%后开始实施，工期 90 日历天。两个公司在工程实施过程中，相继发生了施工工期严重超期、施工单位不服从管理、拖欠农民工工资和工程质量整改不及时引发群众上访等严重问题，故我局认为上述两个施工企业不具有履行合同的能力，拟拒绝接受其中标，拒绝理由为：

— 2 —

1.陕西光明建工集团有限公司：一是**工期严重超期**。工期要求 90 天完成，已完成形象进度 90%，还不具备验收条件，已完成资料审核通过 50%工程量已完成提款报账，无款超出工期 300 余天(详见附件 2)；二是**施工单位不服从管理**。监理单位向施工单位先后发出 7 份监理通知书，施工单位均未按要求书面回复且施工变更内容至今未提交审批，经多次催促后，仍拒不报验单元工程质量评定材料(详见附件 3)；三是**拖欠农民工工资至今未能结清**。陕西光明建工集团有限公司未能结清多项涉及农民工工资款项，工程款到位后没有按要求优先处理拖欠农民工工资问题，引起信访问题(详见附件 4.5.6)；四是**工程质量整改不到位、不及时**。自 2024 年 4 月陕西光明建工集团有限公司承建利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(石龙坝镇德茂村灌溉沟渠工程)项目以来除未按工期交付验收以外，已建沟渠出现沟渠漏水的质量缺陷，发现问题后当即召开现场会议责令整改。施工单位未能在会议上承诺的期限内整改完成验收且至今未能解决问题，因沟渠漏水导致农民春耕受到影响引起了群众信访问题(详见附件 7.8)。

2.广西方信建设工程有限公司：一是**工期严重超期**。工期要求 90 天完成，已完成形象进度 75%，还不具备验收条件，已完成资料审核通过 50%工程量已完成提款报账，无款超出工期 300 余天(详见附件 9)；二是**施工单位不服从管理**。监理单位向施工单位先后发出 9 份监理通知书，施工单位均未按要

— 3 —

求书面整改到位情况且施工变更内容至今未提交审批，经多次催促后，仍未报验单元工程质量评定材料(详见附件 10)；三是**拖欠农民工工资至今未能结清**。广西方信建设工程有限公司未能结清多项涉及农民工工资款项，工程款到位后没有按要求优先处理拖欠农民工工资问题，被拖欠农民工到华坪县农业农村局投诉信访(详见附件 11.12)；四是**未按图纸施工，擅自改变施工地点**。自 2024 年 4 月广西方信建设工程有限公司承建利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(船房乡灌溉沟渠工程)项目以来除未按工期交付验收以外，未经报告及审批同意，擅自调整建设沟渠位置(详见附件 13)。

鉴于以上原因，华坪县农业农村局提出拟拒绝以上 2 家投标人的报价，并按程序依次选择递交了最低评标价而又实质性响应招标文件要求的投标人，请云南省农业农村厅农发项目管理办公室审核后，报请国际农业发展基金进行前审。

特此报告！

附件：1.告知函 01

2.施工合同(2024 陕西光明)

3.监理通知单(陕西光明)

4.群众反映的违规转包合同(陕西光明)

5.欠条(陕西光明)

6.市长热线转办件(陕西光明)

— 4 —

华坪县农业农村局依规向省办汇报片区二合理顺延中标人的材料证明：

华坪县利用国际农业发展基金实施乡村振兴项目工作领导小组办公室文件

华农发基金办报〔2025〕3号

签发人：李国鑫

关于请求同意利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施(改造提升片区二)项目合理顺延中标人的报告

云南省农业农村厅农发项目管理办公室：

华坪县农发基金项目办开展了利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施(改造提升片区二)(合同号：HP-G-24-002、招标编号：0773-2440GN0EGCGK6671)的招标工作，于2025年01月17日上午9:00点在丽江市公共资源交易中心完成开评标工作，共收到6家投标人递交投标文件。

一、招标情况

评审专家对通过初步评审的单位，按照评标价由低到高的顺序，进行资格审查。投标报价排名第一的投标单位为**衡阳宏盛建设有限公司**，投标价为2122872.36元，工期60日历天，

1.陕西光明建工集团有限公司：一是**工期严重超期**。工期要求90天完成，已完成形象进度90%，还不具备验收条件，已完成资料审核通过50%工程量已完成提款报账，无故超出工期300余天（详见附件2）；二是**施工单位不服从管理**。监理单位向施工单位先后发出7份监理通知书，施工单位均未按要求书面回复且施工变更内容至今未提交审批，经多次催促后，仍拒不报验单元工程质量评定材料（详见附件3）；三是**拖欠农民工工资至今未能结清**。陕西光明建工集团有限公司未能结清多项涉及农民工工资款项，工程款到位后没有按要求优先处理拖欠农民工工资问题，引起信访问题（详见附件4.5.6）；四是**工程质量整改不到位、不及时**。自2024年4月陕西光明建工集团有限公司承建利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(石龙坝镇德茂村灌溉沟渠工程)项目以来除未按工期交付验收以外，已建沟渠出现沟渠漏水的质量缺陷，发现问题后当即召开现场会议责令整改，施工单位未能在会议上承诺的期限内整改完成验收且至今未能解决问题，因沟渠漏水导致农民春耕受到影响引起了群众信访问题（详见附件7.8）。

2.广西方信建设工程有限公司：一是**工期严重超期**。工期要求90天完成，已完成形象进度75%，还不具备验收条件，已完成资料审核通过50%工程量已完成提款报账，无故超出工期300余天（详见附件9）；二是**施工单位不服从管理**。监理单位向施工单位先后发出9份监理通知书，施工单位均未按要

该投标人满足招标文件规定的资格条件，通过资格评审。**衡阳宏盛建设有限公司**未按要求在规定的时间内与华坪县农业农村局签订施工合同，且未对《告知函》（详见附件1）进行回复，因此，按程序将取消**衡阳宏盛建设有限公司**的中标资格并把合同授予下一个递交了最低评标价并实质性响应招标文件，且具有履行合同能力的投标人。

投标报价排名第二的陕西光明建工集团有限公司，投标价为3203184.90元；投标报价排名第三的广西方信建设工程有限公司，投标价为3248874.53元；投标报价排名第四的云南正润建设工程有限公司，投标价为3314966.25；根据评标报告内容显示，以上三家投标单位均已实质性响应招标文件。

二、拟拒绝接受中标单位及理由

2024年04月，陕西光明建工集团有限公司和广西方信建设工程有限公司分别以异常低价的情况中标了“利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(石龙坝镇德茂村灌溉沟渠工程)项目”和“利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(船房乡灌溉沟渠工程)项目”，要求两家公司分别提高履约担保至20%后开始实施，工期90日历天。两个公司在工程实施过程中，相继发生了施工工期严重超期、施工单位不服从管理、拖欠农民工工资和工程质量整改不及时引发群众上访等严重问题。故我局认为上述两个施工企业不具有履行合同的能力，拟拒绝接受其中标，拒绝理由为：

求书面整改到位情况且施工变更内容至今未提交审批，经多次催促后，仍未报验单元工程质量评定材料（详见附件10）；三是**拖欠农民工工资至今未能结清**。广西方信建设工程有限公司未能结清多项涉及农民工工资款项，工程款到位后没有按要求优先处理拖欠农民工工资问题，被拖欠农民工到华坪县农业农村局投诉信访（详见附件11.12）；四是**未按图纸施工，擅自改变施工地点**。自2024年4月广西方信建设工程有限公司承建利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县气候智能基础设施发展(船房乡灌溉沟渠工程)项目以来除未按工期交付验收以外，未经报告及审批同意，擅自调整建设沟渠位置（详见附件13）。

鉴于以上原因，华坪县农业农村局提出拟拒绝以上2家投标人的报价，并按程序依次选择递交了最低评标价而又实质性响应招标文件要求的投标人，请云南省农业农村厅农发项目管理办公室审核后，报请国际农业发展基金进行前审。

特此报告！

附件：1.告知函02

2.施工合同(2024陕西光明)

3.监理通知书（陕西光明）

4.群众反映的违规转包合同（陕西光明）

5.欠条（陕西光明）

6.市长热线转办件（陕西光明）

省办拟同意并上报农发基金的函；

国际农发基金云南省项目办

关于拟同意华坪项目办对华坪县 2024 年 改善气候应对能力的基础设施项目 合理顺延中标人报告的函

国际农发基金：

收到《关于请求同意利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区一）项目合理顺延中标人的报告》、《关于请求同意利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）项目合理顺延中标人的报告》，省项目办拟同意华坪县项目办拒绝陕西光明建工集团有限公司、广西方信建设工程有限公司的投标，并进行顺延的请求，望你办同意，盼复。

国际农发基金云南省项目办
(农发基金云南省项目办
印章)
2025 年 3 月 7 日

附件 6：农发回复意见

农发基金就华坪工程回复的意见及截图：

